

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) Objednatel:

Název: **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Lubor Tomanec, ředitel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 387 761 560
e-mail: vstab@vstab.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubor Tomanec, ředitel

zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmer, technický náměstek; Zdeněk Zeman, technik

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – Ing. Petr Jerhot, Bc. Patrik Pudil, Pavel Malý

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2) Zhotovitel:

Název: **HES stavební s.r.o.**
sídlím: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČO: 281 43 213
DIČ: CZ281 43 213
jednatel: Michal Jakubec, jednatel

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 239567

zástupce pro věci smluvní: Michal Jakubec

zástupce pro věci technické: Michal Jakubec

bankovní spojení: OBERBANK AG

číslo účtu: 205 110 8504/8040

tel. +420 732 116 479 e-mail: info@hes-stavebni.cz

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Kubát

- obor autorizace stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

- číslo autorizace: 32493

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace“ dne 12.03.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 Vzhledem ke změnám stavby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s § 222 ZZVZ a které jsou vymezeny v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku nelze dohodnuté dílo dokončit a předat v původně dohodnutém termínu dle Smlouvy o dílo.
- 1.3 Všechny takto dohodnuté změny stavby byly odsouhlaseny technickým dozorem Objednatele a Zhotovitel k nim zpracoval krycí list, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.4 Proto se smluvní strany dohodly na úplném nahrazení čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo následujícím textem:
*„Předání a převzetí staveniště: 18.03.2021.
Dokončení stavebních prací: **do 17.12.2021.**
Předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací.
Předání a převzetí díla: do 5 dnů ode dne předání dokladové části a DSPS.
Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací, který tvoří Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.“*
V návaznosti na takto odsouhlasenou změnu čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dále dohodly na úplném nahrazení její Přílohy č. 2 (harmonogram stavebních prací), a to aktualizovaným harmonogramem stavebních prací, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto dodatku.
- 1.5 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje do 5. 11. 2021 zpracovat změnové listy uvedených změn stavby (víceprací a méněprací) na úrovni položek výkazu výměr, které budou v souladu s § 222 ZZVZ, tj:
 - a. Změny neumožní účast jiných dodavatelů a neovlivní výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - b. Změny nezmění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele;

c. Změny nepovedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

- 2.3 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- Příloha č. 1 – krycí list změn stavby
 - Příloha č. 2 – změny stavby
 - Příloha č. 3 – aktualizovaný harmonogram stavebních prací

Objednatel

Zhotovitel

V Táboře dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Ing. Lubor Tomanec
Digitálně podepsal
Ing. Lubor Tomanec
Datum: 2021.10.21
11:58:19 +02'00'

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Ing. Lubor Tomanec, ředitel

Michal Jakubec
Digitálně podepsal
Michal Jakubec
Datum: 2021.10.20
18:36:14 +02'00'

HES stavební s.r.o.

Michal Jakubec, jednatel

Stavba: SÚstí, reko VaK a komunikace Šafaříkova

Změnový list č. 01

Datum předložení zhotovitelem 14.10.2021

Objednatel	Objednatel: Město Sezimovo Ústí a Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
TDS	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	HES stavební s.r.o.

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:

Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku ulice Šafaříkova v Sezimově Ústí
Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace

Specifikace změny:

Pořadové číslo	Označení	Popis	Od	Do	Dnů celkem
1.	ZBV_0XX	Zaslepení stávajících přípojek splaškové kanalizace - 14 ks (vyvrtání a zaslepení) v 1. etapě	27.04.2021	Dokončení prací	14
2.	ZBV_0XX	Nová dešťová kanalizace PP DN 500, se šachtou DN 1000 vedle parkoviště	06.05.2021	20.05.2021	15
3.	ZBV_0XX	Změna zatřídění těžitelnosti - skála	19.05.2021	30.06.2021	43
4.	ZBV_0XX	Kamenná zeď parkoviště - posouzení : archeolog, statik a vrtání	11.05.2021	20.05.2021	10
5.	ZBV_0XX	Kamenná zeď parkoviště - dokončovací a podpůrné práce (objímky, těsnění)	30.06.2021	30.06.2021	0,5
6.	ZBV_0XX	Propojení podzemní komory jednotné kanalizace a šachty SP1 a propojení z SP1 do stávající kanalizace	14.06.2021	16.06.2021	3
7.	ZBV_0XX	Šachta navíc na dešťové kanalizaci DN 250 (MEZI ŠACHTOU Š11 - 12)	21.07.2021	22.07.2021	2
8.	ZBV_0XX	Přeložení kabelu EG.D - NN	16.08.2021	20.08.2021	5
9.	ZBV_0XX	Cetín a Nej TV - kolize vedení	03.08.2021	09.09.2021	38
10.	ZBV_0XX	Nová dešťová přípojka svodu č.p. 191 a napojení do nově vybudované přípojky dešťové kanalizace DN 250 - délka 9 m	02.08.2021	02.08.2021	1
11.	ZBV_0XX	Nevhodné klimatické podmínky - trvalý déšť	13.05.2021	13.05.2021	1
12.	ZBV_0XX	Nevhodné klimatické podmínky - trvalý déšť	05.08.2021	05.08.2021	1
13.	ZBV_0XX	Nevhodné klimatické podmínky - trvalý déšť	06.10.2021	06.10.2021	0,5
Celkem					134

S ohledem na překrývající se průběh jednotlivých výše uvedených víceprací je nový termín dokončení stavebních prací stanoven na 17.12.2021.

Zdůvodnění změny:

Pořadové číslo	Označení	Popis	Zdůvodnění
1.		Zaslepení stávajících přípojek splaškové kanalizace - 14 ks (vyvrtání a zaslepení) v 1. etapě	Rušení napojení původních kanalizačních přípojek viz. příloha č. 1 (kopie SD)
2.	ZBV_0XX	Nová dešťová kanalizace PP DN 500, se šachtou DN 1000 vedle parkoviště	Vzhledem k zjištěným okolnostem, které kolidují s nově navrženou trasou vedení kanalizace viz. příloha č. 2-4 (kopie SD)
3.	ZBV_0X	Změna zatřídění těžitelnosti - skála	Na základě zjištění v průběhu stavby byla detekována skála ve výkopistích viz. příloha č. 2-4 (kopie SD) + zaměření 3.1 až 3.2 + těžitelnost 3.3
4.	ZBV_0X	Kamenná zeď parkoviště - posouzení : archeolog, statik a vrtání	Při výkopových pracích zastižena ve výkopisti neavizovaná zeď, která způsobila kolizi s navrženými trasami kanalizace a vody viz. příloha č. 2-4 (kopie SD)
5.	ZBV_0X	Kamenná zeď parkoviště - dokončovací a podpůrné práce (objímky, těsnění)	Při výkopových pracích zastižena ve výkopisti neavizovaná zeď, která způsobila kolizi s navrženými trasami kanalizace a vody viz. příloha č. 5 (kopie SD) + foto 5.1 až 5.3
6.	ZBV_0X	Propojení podzemní komory jednotné kanalizace a šachty SP1 a propojení z SP1 do stávající kanalizace	Vzhledem k zjištěným okolnostem, tzn. skutečně zjištěný stav původního vedení kanalizace, která je v kolizi s nově navrženým stavem průběhu kanalizace viz. příloha č. 6 (kopie SD) + foto 6.1 až 6.3
7.	ZBV_0X	Šachta navíc na dešťové kanalizaci DN 250 (MEZI ŠACHTOU Š11 - 12)	Vzhledem k zjištěným okolnostem, tzn. skutečně zjištěný stav okolních konstrukcí a terénu ve výkopisti, je nově navržena šachta navíc viz. zápis z 17. KD z 21.7.2021 příloha č. 7 + foto 7.1 až 7.4
8.	ZBV_0X	Přeložení kabelu EG.D - NN	Při výkopových pracích zjištěna kolize mezi stávajícím, dříve neidentifikovaným vedením rozvodů EG.D - NN a nově budovanými prvky komunikací, což vede k provedení zemních prací, uložení do chráničky a následnému zprovoznění viz. příloha č. 7 (kopie SD) + foto 8-9.1 až 8-9.13
9.	ZBV_0X	Cetín a Nej TV - kolize vedení	Při výkopových pracích zjištěna kolize mezi stávajícím, dříve neidentifikovaným vedením rozvodů společností Cetín a Nej TV a nově budovanými prvky kanalizace a komunikací, nutno provést přeložení vč. všech s tím spojených stavebních prací viz. příloha č. 8-9 (kopie SD) + foto 8-9.1 až 8-9.13
10.	ZBV_0X	Nová dešťová přípojka svodu č.p. 191 a napojení do nově vybudované přípojky dešťové kanalizace DN 250 - délka 9 m	Vzhledem k zjištěnému stavu je potřeba napojit dříve nazastížený stávající dešťový svod do nově budované kanalizace viz. příloha č. 10 (kopie SD) + foto 10.1 až 10.2
11.	ZBV_0X	Nevhodné klimatické podmínky - trvalý déšť	Klimatické podmínky neumožňující dodržení technologického postupu na stavbě viz. zápis ve SD ze dne 13.05.2021
12.	ZBV_0X	Nevhodné klimatické podmínky - trvalý déšť	Klimatické podmínky neumožňující dodržení technologického postupu na stavbě viz. zápis ve SD ze dne 05.08.2021
13.	ZBV_0X	Nevhodné klimatické podmínky - trvalý déšť	Klimatické podmínky neumožňující dodržení technologického postupu na stavbě viz. zápis ve SD ze dne 06.10.2021

Finanční dopad změny: V řešení - bude součástí ZL č. 02

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	příloha č. 1 (kopie SD) příloha č. 2-4 (kopie SD) příloha č. 2-4 (kopie SD) příloha zaměření 3.1 příloha zaměření 3.2 příloha těžitelnost 3.3 příloha č. 2-4 (kopie SD) příloha č. 5 (kopie SD) příloha č. foto 5.1 příloha č. foto 5.2 příloha č. foto 5.3 příloha č. 6 (kopie SD) příloha foto 6.1 příloha foto 6.2 příloha foto 6.3 příloha zápis z 17. KD z 21.7.2021 příloha č. 7 příloha foto 7.1 příloha foto 7.2 příloha foto 7.3 příloha foto 7.4 příloha č. 7 (kopie SD) příloha č. 8-9 (kopie SD) příloha foto 8-9.1 příloha foto 8-9.2 příloha foto 8-9.3 příloha foto 8-9.4 příloha foto 8-9.5 příloha foto 8-9.6 příloha foto 8-9.7 příloha foto 8-9.8 příloha foto 8-9.9 příloha foto 8-9.10 příloha foto 8-9.11 příloha foto 8-9.12 příloha foto 8-9.13 příloha č. 10 (kopie SD) příloha foto 10.1 příloha foto 10.2
----------	--

Schvalovací proces:**Podpis a razítko TDS**

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-33-

Bc. Patrik Pudil

Datum:

Podpis a razítko AD

AQUA PROCON s.r.o.
divize Praha
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha 7, ČR
DIČ: CZ46964771

Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do celkového HMG stavby. Nový termín dokončení stavebních prací je stanoveno na datum 17.12.2021. Je avizován dopad do ceny, který je ve fázi schvalovacího řízení. Cenová část jednotlivých ZBV bude řešena jednotně ve ZL č. 02.

Podpis a razítko zhotovitele

Michal
Jakubec

Digitálně podepsal
Michal Jakubec
Datum: 2021.10.15
11:00:19 +02'00'

Michal Jakubec

Datum: 14.10.2021

Podpis a razítko objednatele Město Sezimovo ÚstíZměnu schvaluji / ~~neschvaluji~~

Mgr.Ing.
Martin Doležal

Digitálně podepsal
Mgr.Ing. Martin Doležal
Datum: 2021.10.21
10:40:55 +02'00'

Datum:

**Podpis a razítko objednatele Vodárenská společnost
Táborsko s.r.o.**Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~

VST
Kosova 2094
390 02 Tábor
IČO: 26069539

Vodárenská společnost
Táborsko s.r.o.
Tel.: 381 257 869
Fax: 381 257 944
DIČ: CZ28069539

Datum:

Pocasi: Sluzobasno +11°C

Pracovníci: 4 + 1 THP, 1 x fi Vlva, 1 x Kozanda

Prac. doba: 6.30 - 16.00

Heframizace: Celni nadelodaj, baje 3,5, Alvia-Kozanda

Prace: Priprava pazhotitje a zastanazace
pro obrubky, otvoz asfaltu, nabezen
prorub - 1 x Ldaž Kobilha, mohutost sudovodu
uop pro are nožni porubi

26.4.2021

Pocasi: Sluzobasno +12°C

Pracovníci: 4 + 1 THP, 1 x fi Vlva, 1 x Kozanda

Prac. doba: 6.30 - 16.00

Heframizace: Celni nadelodaj, baje 3,5, Alvia-Kozanda

Prace: Cistym sparzove otory pro zaslepem
periodimot vstupni, napojovim
m mrozivosti na statagie, novi
pripojky.

27.4.2021

RUSEM NABOJEVI, PUVODNIAKHNALIZACNICH

POPOJEK:

- spara mazi sel vlozkom a
potrubim bude zatmelana
- vnajsi statia potrubu bude oistena,
napretronica
- misto napojni bude „preplatoviti“
vyzabam z potrubu PK DN 500
(na fme/)
- misto bude detonodeno (+ min = 10 cm)

(VP)

ZASLEPEM VTRPJEK

①

CELAK

KOTEK

Pocasi: Jarmo +15°C

Pracovníci: 3 + 1 THP, 1 x fi Vlva, 1 x Kozanda

Prac. doba: 6.30 - 14.00

Heframizace: Celni nadelodaj, baje 3,5, Alvia-Kozanda

Prace: Napojovim splošne kanalizace,
Kocem srozni - IS Plano

28.4.2021



PRO-DOMA

PRO-DOMA, SE, Centrála Mukařov, U Mototechny 89, 251 62 Mukařov

Denní záznamy stavby:

List č.: 30788

Datum:

Počasí: Zataženo dešt + 9°C Pracovníci: 4 + 1 THP + 1x kozanda Prac.doba: 6.30 - 12.00 Mechanizace: Celni nakladač, bagr 19+, bagr 3,5 (př. 10) Tatza - kozanda Práce: Odvoz arfal + u, zoplocení staveniště - oprava, přebíhání betonového den za těžší zastupců investora a stavebního dozoru. Zopis ED provedl pan Puchlil.	5.5.2021 et
Počasí: Polojasno + 11°C Pracovníci: 5 + 1 THP + 1x kozanda Prac.doba: 6.30 - 16.00 Mechanizace: Celni nakladač, bagr 19+, bagr 3,5 - př. 10. Tatza - kozanda SAT Práce: Vkládání dístové kanalizace ul. E. Beneše stávající rozostř ul. Safforčova, čístelem kanalizace ul. E. Beneše	6.5.2021 et
Na základě dohody se zastupcem investora - město Sezimovo Ústí, panem ing. Pracovkem, byla dohodnuta výstavba nové řádky na dístové kanalizaci v ulici Dr. E. Beneše v místě před loubou přes košový potok a například mělní potrubí DN 500 pod rozbovístem zastavovací ul. Vily, na toto bude napojena UV rozbovístě. I toto práce jsem mluvil se zastupcem a bude na mě zhotoven změnový list s úpravou ceny.	(VP) PŘÍST KRM DN 500 od 6.5 - 20.5. (2)
Počasí: Polojasno + 13°C Pracovníci: 5 + 1 THP + 1x VLNA + 1x kozanda Prac.doba: 6.30 - 16.00 Mechanizace: Celni nakladač, bagr 19+, bagr 3,5, TATZA - kozanda Práce: Zpracování výkopu pro řádku dístové kanalizace ul. E. Beneše, dopořování splaškové kal. ep. 833	7.5.2021 Pč



PRO-DOMA

PRO-DOMA, SE, Centrála Mukařov, U Mototechny 89, 251 62 Mukařov

Počasí: Jasně + 25°C
 Pracovníci: 6 + 1 THP 1x fillna, 1x korunda 30
 Prac. doba: 6.30 - 16.00
 Metrizace: celni metodou, bagr 19+, bagr 3,5
 1a2a - korunda
 Práce: Výkop pro splaškovou kanalizaci
 č.p. 1033, 872, výkop deštol
 kanalizace v pozemosti

10.5.2021

Počasí: Jasně + 29°C
 Pracovníci: 4 + 1 THP
 Prac. doba: 6.30 - 16.30
 Metrizace: celni metodou, bagr 19+, bagr 3,5
 1a2a - korunda
 Práce: dopřetí splaškové kanalizace,
 výkop deštol kanalizace - pozemosti,

11.5.2021

Počasí: Přehledně + 8°C
 Pracovníci: 6 + 1 THP
 Prac. doba: 6.30 - 16.00
 Metrizace: celni metodou, bagr 19+, bagr 3,5
 Práce: dopřetí splaškové kanalizace, číselní výkop
 deštol E. Beneše.
 Zápis archeologa

12.5.2021

Dne 11.5.2021 byla zadržena novovládná opěrná
 kamenná zeď stojící na betonové zákl. m. a t. m.
 Po jejím zadržetí a vypracování bylo
 zjištěno, že se jedná o novovládnou zeď.
 Patrně se jedná o opěrnou zeď z doby
 výstavby objektu (1935). Byla provedena
 fotografická dokumentace.
 Je možné pokračovat dále v hrubých
 pracích bez omezení.
 Za MDT v táboře JAHODA

KAMENNÁ ZEŤ
PARKOVISTE

(4)

ZÁPIS STATIKA & DEŠT. KANALIZACE

BUDE PROVÁDĚN VÝKAT V PŮVODNÍ OPĚRNÉ
 STĚNĚ Š. ca 11m v hloubce ca 85m
 8600mm SPECIÁLNÍM FIRMAM
 VRT BUDE PROVÁDĚN JAPROVON TECHNOLOGIÍ
 S VYPRACOVÁNÍM NBSH SE PROVÁDĚT
 BAUPRÁCI KORDIVY!



PRO-DOMA

PRO-DOMA, SE, Centrála Mukařov, U Mototechny 89, 251 62 Mukařov

DN 500
KANALIZACI V DOPORUČENÍ VLOŽIT DO
KURTANĚHO PŘESTAVU S REZERVOU
CCA 30 mm TAK ABY BYL ZABRÁNĚNO
VSTŘIKOVÁNÍ POTRUBÍ PŘI HUTNĚNÍ,
POTRUBÍ DOPORUČENÍ VLOŽIT DO PÍSTOLEHO
LOŽE A OBSYPAT.
ZPĚTNÝ ZÁSYP BUDE HUTĚN POUZE KUDKOU
ZEMINOU DLE ČSN 73 6133 PO VSTUPU
KAT. 250 mm MOCNOSTI NA EDEL = 30 MPa.

TOMÁŠ TOUREK
Touš Toub

Počasí: Zataženo, dle + 6°C

13.5.2021

Převníci: 2 + 1 THP

6

Prac. doba: 630 - 1430

Mechanizace: Celní urolodac, bagr 19+, bagr 3,5+

Přeci: Sčítání pozice lokit, odvoz kory

Pracovní: Koblík

Z důvodu nepřizpůsobivosti eliminace
podmíněk, byli pracovníci upozorněni dle
přikazů.

Počasí: Polojasno + 10°C

14.5.2021

Převníci: 3 + 1 THP + 1x koranda

7a

Prac. doba: 630 - 1600

Mechanizace: Celní urolodac, bagr 19+, bagr 3,5+
142a - koranda

Přeci: Sčítání, zaměření obručů, očištění
a zapázení úrovně pro novou pístovou
kanalizaci a proložení pozice.



Pocasi: Plojasno +12°C

Pracovníci: 4 + 1 THP + 1 x koranda

Prac. doba: 6.30 - 16.30

Medianizace: celni melledaj bagz 19+, bagz 3, 5+

Tatza - Koranda

Prace: Zastavení výkopu po oprávnění,
spláštění zemlizek, hutnění,
zastavení střešního napojení spláštění
zemlizek 1033,17.5.2021
P₀

Pocasi: Plojasno +12°C

Pracovníci: 4 + 1 THP + 1 x koranda, 2 x EKAN

Prac. doba: 6.30 - 16.00

Medianizace: celni melledaj bagz 19+ 3, 5+

Tatza - Koranda

Prace: Vytarba deston zamalizace ul.
F. Benise - EVOS, výkop počty, zastavení
výkopu, zabetonování dna počty18.5.2021
L₁

Pocasi: Plojasno +15°C

Pracovníci: 4 + 1 THP + 1 x koranda, EKAN - 2x

Prac. doba: 6.30 - 16.00

Medianizace: celni melledaj bagz 19+, 5+

Tatza - Koranda

Prace: Betonování počty deston zamalizace
F. Benise, zastavení výkopu deston,
zamalizace ul. Sajež, zabetonování
otvoru u zdi a pak konití pro kamaliz
- EKAN ..19.5.2021
S₁VETÁNI ZDI
EKAN
19-20.5.

④

INVESTOR: KADENÍM VLOŽEC TUDY VLOŽEN V DOKON
V SKLADU PÁTRIKU DO ŽOPE. OPROCEK. P.

Pocasi: Zataženo +10°C

Pracovníci: 4 + 1 THP, 1 x koranda, EKAN - 2x

Prac. doba: 6.30 - 16.00

Medianizace: celni melledaj bagz 19+, 3, 5+

Tatza - Koranda

Prace: Napojování deston zamalizace
a pozemní zedny p. zrubu dremat
zabetonování počty, ke výkopu
deston zamalizace zjištění o zedat
přístěn gedof na pozemní.20.5.2021
C₁

Zpráva geolog:

Bylo provedeno posouzení těžitelnosti hornin
ve výkopu. Zpráva bude předána objednateli.

20.5.21

Z ALSEO TESI

ZMĚNA TĚŽITELNOSTI

ZAHÁJENÍ PRÁCE
od 21.5. do 30.6.

(3)

Pocasi: Jolojarno + 12°C

Pracovníci: 5 + 1 THP, 1x koranda

Prac. doba: 6.30 - 17.00

Metamizace: Celni nakladač, bagz 19+, 3,5+,
Tatra - koranda, DafPráce: zatežení výkopu dešťové kanalizace
a rozbojení, výkop ml. Safažkové a
šachty, vyhotovení dna šachty
ml. Klumse, montáž ovláčky UV a
rozbojení,

Pocasi: Skorojarno + 15°C

Pracovníci: 6 + 1 THP

Prac. doba: 6.30 - 16.00

Metamizace: Celni nakladač bagz 19+ 3,5+
Tatra - koranda, DafPráce: výkop dešťové kanalizace ml. Safažkové
zbytek rozbojení, montáž ovláčky
rozbojení, zatežení pozicích
boxu,

Pocasi: Jolojarno s přehlednými + 11°C

Pracovníci: 7 + 1 THP

Prac. doba: 6.30 - 16.00

Metamizace: Celni nakladač, bagz 19+ 3,5+
Daf, bagz 19+ + kladivo,Práce: Rozboření pozicích boxu, zatežení
a kmitání výkopu rozboření, posouzení
výkopu dešťové kanalizace za pomoci
bohracího kladiva na posouzení bagzu

24.5.2021

70

25.5.2021

4+



125/2

125/1

125/3

175m3

833/1

834/3
1112

835/5
2901

194/6
168

195/8
169

1102/1
2911

garáž

zam.

zam.

1.05

1.65


2.10m

dl.

dl.

zam.

8

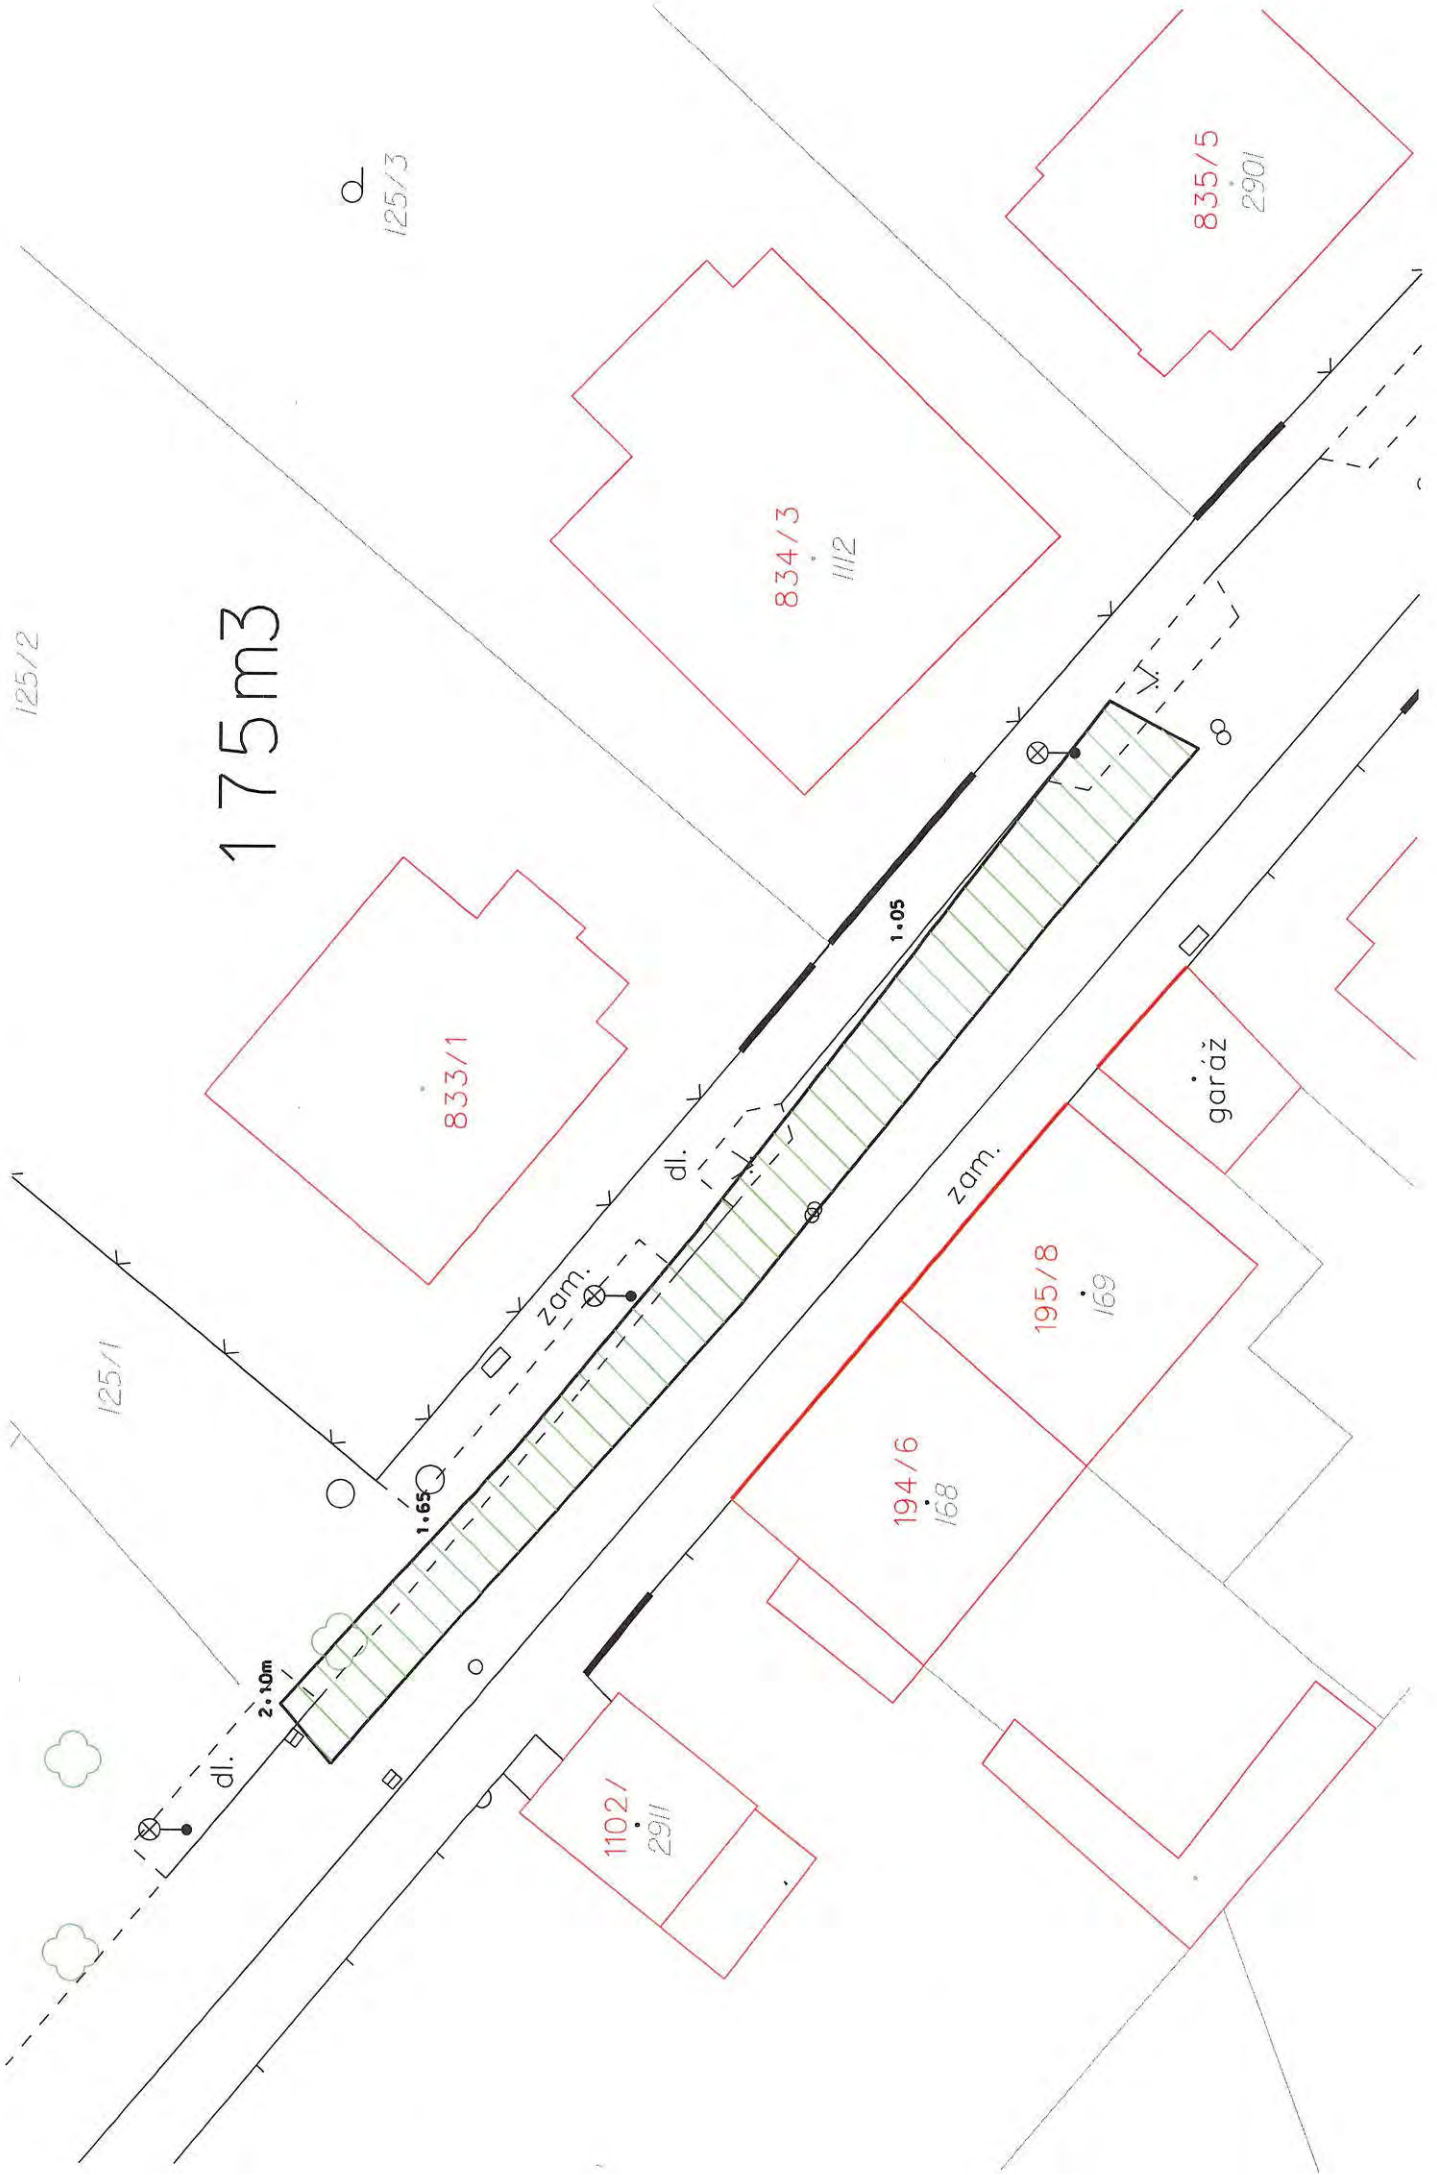

PROTOKOL č.

2/290/2021

Stavba: Sezimovo Ústí – Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku, ulice Šafaříkova

Objednatel: HES stavební s.r.o.

Datum měření: 3.6.2021

Předmět měření: kubatura skály

Specifikace provedených prací

Dne 3.6.2021 byly zaměřeny body odkopané skály v části úseky Šafaříkovy ulice. Na základě zaměření byla vypočtena kubatura odkopané skály.

Výsledná kubatura: 175m³

Vytyčovací podklady: WAY project s.r.o. JH – ing. M.Šedivý

Výkres: Geodetický koordinační výkres +Vytyčovací protokol **číslo výkresu:** C.411,C.412+ C.42.

Použité přístroje: GPS TRIMBLE R4

Měřil: ing. J.Novák

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Geodetické základy: Body stavby určené metodou GPS.

Související předpisy: ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2

Přílohy: 1. Vytyčovací výkres (Situace)

Poznámka: Zástupce objednatele převzal vytyčené body v terénu.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Datum ověření: 23.6.2021

Číslo ověření: 1215/2021

Vyhotovil dne: 23.6.2021

Převzal dne:

.....
Podpis
jméno (hůlkovým písmem)
Ing. Jiří Novák

.....
Podpis

Akce: Sezimovo Ústí – rekonstrukce VaK a komunikace Šafaříkova
Věc: Posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu

Z geologického hlediska náleží území do krystalinika Českého masívu, do moldanubické oblasti a je tvořeno zejména metamorfovanými horninami typu pararuly až migmatitu. Kvartérní pokryvy jsou pak tvořeny zejména fluvialními sedimenty (hlína, písek, šterk) a deluviálními sedimenty (píščito-hlinité až písčité).

V podloží těchto vrstev v úrovni 0,30m – 0,90m byly ověřeny polohy jílovitého šterku až šterkopísku, s valouny a úlomky do velikosti 10cm. Jedná se o navážku. Z hlediska těžitelnosti řadíme tuto vrstvu rovněž do **třídy těžitelnosti 3** podle ČSN 73 3050, resp. do třídy I dle ČSN 73 6133, tj. kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, rýpadlem a obdobnými běžnými mechanismy.

V hloubkové úrovni 0,90m – 1,30m je výkop prováděn v polohách světle hnědých zvětralých slídnatých pararul, s výrazně horizontální vrstevnatostí. Hornina je rozpadavá, ve výplni poruch zvětrává až na písčitojílovitou zeminu. Z hlediska těžitelnosti řadíme tuto vrstvu rovněž do **třídy těžitelnosti 4** podle ČSN 73 3050, resp. do **třídy II** dle ČSN 73 6133, tj. drobné pevné horniny rozpojitelé klínem či rýpadlem.


V hloubkové úrovni 1,30m – 1,90m byly zastiženy polohy rezavě hnědých navětralých slídnatých pararul, s nepravidelným systémem diskontinuit jejichž vzdálenost nepřesahuje 0,15m. Jedná se o horniny obtížně rozpojitelé kladivem. Fragmentace výkopku dosahuje velikosti až 0,30m. Celkový objem balvanů velikosti od 250 mm do 0,1m³ nepřesahuje 50% objemu výkopku. Zastižené polohy lze zařadit do **třídy těžitelnosti 5** podle ČSN 73 3050, resp. do **třídy II** dle ČSN 73 6133, tj. horniny lehce trhatelné, rozpojitelé rozrývačem nebo těžkým rýpadlem.

Dno výkopu bylo tvořeno mírně navětralými až zdravými pararulami, velmi obtížně rozpojitelnými těžkým rýpadlem či rozrývačem. Systém poruch je velmi nezřetelný. Povrch nelze škrábat bagrem se skalní lžící. Zastižené polohy lze zařadit do **třídy těžitelnosti 6** podle ČSN 73 3050, resp. do **třídy II** dle ČSN 73 6133.

Na základě zjištěných skutečností bylo určeno poměrné zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti, které uvádíme v následující tabulce:

Tabulka č.1 – Poměrné zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti

třída těžitelnosti	podíl
třída 3	30%
třída 4	13%
třída 5	20%
třída 6	37%



V Praze, dne 21.5.2021

Mgr. Aleš Jírovec, geolog

FOTODOKUMENTACE

Obr. 2 – celkový pohled na výkop



Obr. 3 – celkový pohled na výkop



Obr. 4 – konstrukce vozovky a jílovitý štěrk



Obr. 5 – poloha zvětralé pararuly.



Obr.6 – navětralá pararula



Obr. 7 – fragmentace výkopku



Obr.8 – dno výkopu – zdravá pararula



Obr. 9 – dno výkopu – zdravá pararula









Počasí: Polojasno +23°C
 Pracovníci: 5 + 2 THP, 1x koranda
 Prac. doba: 6:30 - 15:00
 Mechanizace: celni nakladač, bagr 9,5 +
 latka - koranda
 Práce: Zemní práce na dešťové kanalizaci
 ul. Svatého

11.6.2021

Př

Počasí: Jasně +26°C
 Pracovníci: 7 + 2 THP
 Prac. doba: 6:30 - 16:30
 Mechanizace: celni nakladač, bagr 9,5 +
 latka - koranda
 Práce: Vytváření práce na dešťové
 kanalizaci, příprava parsonáže

14.6.2021

Př

Práce
 Podání korandy
 A JEDN. KANALIZACE

14-16.6

FOTO

⑤

Počasí: Jasně +28°C
 Pracovníci: 7 + 2 THP
 Prac. doba: 6:30 - 16:00
 Mechanizace: celni nakladač, bagr 9,5 +
 latka - koranda
 Práce: Vytváření práce na dešťové
 kanalizaci, příprava parsonáže,
 kterou a napojení
 vodotočů v ul. parsonáže

15.6.2021

4+

Počasí: Jasně +28°C
 Prac. doba: 6:30 - 16:30
 Pracovníci: 7 + 1 THP
 Mechanizace: celni nakladač, bagr 9,5 +
 latka - koranda
 Práce: Vytváření práce na dešťové
 kanalizaci, příprava plně parsonáže

16.6.21

8+









Denní záznamy stavby:

List č.

0603222

Datum:

POČASÍ: OBLAČNO 14-22°C
 PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰ - 16³⁰
 POČET PRACOVNÍKŮ: 5+1THP
 MECHANIZACE: PÁSOVÝ BAGER, KOLÁŘI BAGER, TATRA, NALADNĚ
 POPIS PRÁCE: VÝKOP RÝH DEST. KANALIZACE DN 300, PODSTUP
 A OBŠYP TRUNKY DEST. KANALIZACE NA KONEC ÚSEKU I. (ETAPA 1)
 ZÁSTUP A HUTNĚNÍ DEST. KANALIZACE

20.7.2021
CT

Jh

POČASÍ: PLOŠTASNO 12-24°C
 PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰ - 17⁰⁰
 POČET PRACOVNÍKŮ: 5+1THP

21.7.2021
ST

MECHANIZACE: KOLÁŘI A PÁSOVÝ BAGER, TATRA, NALADNĚ
 POPIS PRÁCE: VÝKOP RÝH DEST. KANALIZACE DN 250, PODSTUP A OBŠYP
 TRUNKY DEST. KANALIZACE, ZÁSTUP A HUTNĚNÍ DEST. KANALIZACE
 PODSTUP A OBŠYP TRUNKY VODOVODNÍHO KANALIZACE DN 160, PŘELOŽENÍ
 FOLIE, ZÁSTUP A HUTNĚNÍ VODOVODNÍHO KANALIZACE DN 160, OSAZENÍ SÍČETI
 S12 VP

Jh

POČASÍ: PLOŠTASNO 12-26°C
 PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰ - 17⁰⁰

22.7.2021
AT

POČET PRACOVNÍKŮ: 5+1THP
 MECHANIZACE: KOLÁŘI A PÁSOVÝ BAGER, TATRA, NALADNĚ
 POPIS PRÁCE: VÝKOP RÝH DEST. KANALIZACE DN 250, PODSTUP
 A OBŠYP TRUNKY DEST. KANALIZACE, ZÁSTUP A HUTNĚNÍ KANALIZACE
 ZÁSTUP A HUTNĚNÍ DEST. KANALIZACE DN 300 A VODOVODNÍHO
 KANALIZACE DN 160, ZÁSTUP A HUTNĚNÍ KOLEN SÍČETI VP

SÍČETA NAUČ
 DEST. KAN. DN 250
 21.7 - 22.7.
 FOTO (6)

POČASÍ: JASNO/PLOŠTASNO 12-28°C
 PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰ - 17⁰⁰

23.7.2021
PA

POČET PRACOVNÍKŮ: 5+1THP
 MECHANIZACE: KOLÁŘI A PÁSOVÝ BAGER, TATRA, NALADNĚ
 POPIS PRÁCE: VÝKOP RÝH DEST. KAN DN 250, OSAZENÍ SÍČETI
 S13, PODSTUP A OBŠYP TRUNKY DEST. KANALIZACE, ZÁSTUP
 A HUTNĚNÍ DEST. KAN. DN 300 A VODOVODNÍHO KANALIZACE DN 160

Jh

Vodň









**„SEZIMOVO ÚSTÍ – ULICE ŠAFAŘÍKOVA – REKONSTRUKCE VODOVODU“
„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, PARKOVACÍCH PLOCH A CHODNÍKU ULICE
ŠAFAŘÍKOVA V SEZIMOVĚ ÚSTÍ“**

TECHNICKÝ KONTROLNÍ DEN Č.17

ve věci: **zápis z TKD č.17**

svolaného: technickým dozorem stavebníka, Bc. Patrik Pudil

konaného: ve středu 21.07.2021 od 13.00 hod

za účasti: viz.preenční listina (viz. příloha č.1)

přílohy zápisu: 1 – prezenční listina

zápis vypracoval: Bc. Patrik Pudil

Zkratky v zápisu, které budou běžně v dalších zápisech používány:

Z – zhotovitel, O – objednatel, U – účastníci výstavby, TDS – technický dozor investora (stavebníka), GP – generální projektant, DPS – dokumentace pro provedení stavby, TKD – technický kontrolní den.

A) Kontrola úkolů z předešlých jednání:

3/3 SO 03 Kanalizační odbočky

O žádá o předložení CN na zaslepení původního zaústění kanalizačních přípojek. [Trvá.](#)
Z doposud nepředložil návrh ZL. [Trvá.](#)

7/3 Parkoviště – stav. kamenná zeď

Z narazil během provádění zemních prací na původní kamennou zeď a původní kanalizaci. [Trvá.](#)

O žádají Z o předložení CN na práce nad rámec SoD. [Trvá.](#)

Z upozorňuje, že tato činnost bude mít vliv na termín dokončení stavby. [Trvá.](#)

Z doposud nepředložil návrh ZL. [Trvá.](#)

8/3 SO 301 – Dešťová kanalizace- vyšší třída těžitelnosti

Z narazil na horninu vyšší třídy těžitelnosti v místě dešťové šachty Š11

Z zajistí geologa (viz samostatný zápis) a geodeta na zaměření skutečného rozsahu vyšší třídy těžitelnosti.

O a TDS žádá Z o předložení návrhu ZL. Z předloží nejpozději do 09.06.2021

Z zaslal dne 23.05.2021 „Posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu“ [Trvá.](#)

Z doposud nepředložil návrh ZL. [Trvá.](#)

9/3 Sběrač A1 úsek Š12 – Š11 – dešťová kanalizace

O souhlasí s ukončením dešťové kanalizace před lípou z důvodu ochrany kořenového systému.

Z vyzve zástupce OŽP Sezimovo Ústí ke kontrole kořenového systému. [Trvá.](#)

Z zajistí zápis do SD odpovědnou osobou – OŽP [Trvá.](#)

TDS upozorňuje na dodržování ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. [Trvá.](#)

O (pan Ing. Prokop) zajistí od GP provedení situace stavby.

Pan Ing. Prokop zaslal dne 07.07.2021 situaci stavby.

ZL bude proveden na základě skutečnosti. [Trvá.](#)

[Z vyzve před realizací zástupce OŽP \(pan Klímu\) – bude projednán způsob provádění s ohledem na kořenový systém.](#)

10/3 Poškození stav. jednotné kanalizace

Z zajistí opravu porušené jednotné kanalizace BE DN500 v úseku Š3 – SP4

Následně bude přizván P (ČEVAK) ke kontrole. TDS požaduje zápis do SD. [Trvá.](#)

TDS, P a O požadují opravu provést vložení nového kusu potrubí a spojení za pomoci manžet.

Z před zahájením prací informuje P jakým způsobem bude provedeno (zápis ve stavebním deníku včetně podpisu). Z sděluje, že bude provedeno výřezem na potrubí, osazena nová betonová trouba + 2 manžety (z nyní prověřuje možnost získání identické trouby-tloušťka stěny). [Trvá.](#)

14/4 TDS žádá Z o vyčištění vodovodní šachty PŠ49, její zakrytí poklopem a odstranění hromady zeminy z jejího zastropení do 6.7.2021.

Neprovedeno, náhradní termín nejpozději do 14.07.2021.

Provedeno pouze z části. Z provede nejpozději do 21.07.2021.

[Provedeno, příště vypustit.](#)

15/4 Splašková kanalizační přípoika pro č.p. 209

Z zajistí opravu netěsné splaškové kanalizační přípojky.

Z provede fotodokumentaci a umístí ji na virtuální disk. [Provedeno, příště vypustit.](#)

B) Průběh jednání:

17/1 Prováděné práce v 29. týdnu:

- Provádění dešťové kanalizace sběrač A1
- Provádění kanalizačních přípojek (dešťové + splaškové)
- Provádění přípojek pro uliční vpusti
- Montáž vodovodního řádu (tlakové zkoušky a odběr vzorků vody)

Plánované práce na 30. týden:

- Dokončení dešťové kanalizace sběrač A1
- Provádění kanalizačních přípojek (dešťové + splaškové)
- Provádění přípojek pro uliční vpusti
- Zásyp rýhy vodovodu a dešťové kanalizace sběrač A

17/2 Kontrola plnění HMG zhotovitelem:

Zhotovitel předložený harmonogram neplní viz níže:

- výstavba dešťové kanalizace – skluz cca 8 týdnů

- výstavba vodovodního řádu – skluz cca 7 týdnů

TDS upozorňuje na značný skluz oproti předloženému HMG a žádá Z o nápravu.

17/3 Příští technický kontrolní den se bude konat ve středu dne 28.7. 2021 od 13:00 hod na stavbě v místě stavby.

Rozdělovník:

Město Sezimovo Ústí

Vodárenská Společnost Tábořsko, s.r.o.

ČEVAK a.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

HES stavební s.r.o.

WAY Projekt s.r.o.


Aqua procon s.r.o.

PŘÍLOHA Č.1

	Technický dozor stavebníka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
„SEZIMOVO ÚSTÍ – ULICE ŠAFAŘÍKOVA – REKONSTRUKCE VODOVODU“ „Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku ulice Šafaříkova v Sezimově Ústí“		

PREZENČNÍ LISTINA


Účel jednání: Technický kontrolní den č.17
Datum: 21. 07. 2021
Místo konání: SEZIMOVO ÚSTÍ – ULICE ŠAFAŘÍKOVA

Jméno, příjmení,	Organizace, firma	Podpis
Pan Zdeněk Zeman	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	
Ing. Jiří Prokop	Město Sezimov Ústí	
Ing. Miloš Kotek	ČEVAK a.s.	
Pan Luboš Kohoutek	ČEVAK a.s.	
Bc. Patrik Pudil	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
Pan Lukáš Vojtěch	Hes-stavební s.r.o.	
Ing. Zdeňka Šmidová	Hes-stavební s.r.o.	
Pan Jan Hořejš	Hes-stavební s.r.o.	
Pan Michal Jakubec	Hes-stavební s.r.o.	

POČASÍ: ZATAŽENO / OBLAČNO 12-22°C PRACOVNÍ DOBA: 7-17⁰⁰ POČET PRACOVNÍKŮ: 5+1THP MECHANIZACE: PŘÍSOUBAČEK 2L, 9L, TATRA, NAKLADAC POPIS PRÁCE: VÝKOP RÝH PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJEK 2RŠ, RUČNÍ VÝKOP A OČISTENÍ KABELŮ CETINÁŘSTVÍ VÝKOP KABELŮ NN A OČISTENÍ (V)	17.8.2021 CT KABEL NN FOTO 18.8.2021 17.8. výhyb + čistění 20.8. výhyb kabelů EG. D (7)
POČASÍ: OBLAČNO 11-20°C PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰-17⁰⁰ POČET PRACOVNÍKŮ: 6+1THP MECHANIZACE: PŘÍSOUBAČEK 2L, 9L, TATRA, NAKLADAC POPIS PRÁCE: OČISTENÍ VÝKOPŮ RUČNÍ, KABELŮ CETINÁŘSTVÍ ZÁSTUP RÝH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK SO O/H, ZÁSTUP RÝH STAVAJÍCÍ ZEMINŮ A HUTNĚNÍ VÝKOPŮ	18.8.2021 ST jm
POČASÍ: OBLAČNO 11-20°C PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰-17⁰⁰ POČET PRACOVNÍKŮ: 6+1THP MECHANIZACE: PŘÍSOUBAČEK 2L, 9L, NAKLADAC, TATRA POPIS PRÁCE: ZÁSTUP / OČISTĚNÍ PŘÍPOJEK VODOVODNÍCH SO O/H ZÁSTUP / HUTNĚNÍ STAVAJÍCÍ ZEMINŮ RÝH PŘÍPOJEK VÝKOP RÝH PŘÍPOJEK DEST. KANALIZACE Č. 194, 195 PROPŘÍPĚNÍ DEST. KANALIZACE DN 160 Č. 194, 195	19.8.2021 CT jm
POČASÍ: OBLAČNO 11-23°C PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰-17⁰⁰ POČET PRACOVNÍKŮ: 6+1THP MECHANIZACE: PŘÍSOUBAČEK 2L, 9L, NAKLADAC, TATRA POPIS PRÁCE: RUČNÍ VÝKOP A OČISTĚNÍ KABELŮ CETINÁŘSTVÍ ZÁSTUP A HUTNĚNÍ RÝH VOD. PŘÍPOJEK, ZPRŮVODNĚNÍ KABELŮ NN PŘECHOD PŘES KOMUNIKACI, KABEL NN LOŽEN V DELENÉ CHYTRÁČCE, ZÁSTUP / OČISTĚNÍ SO O/H, ZEMNÍ PRÁCE V MOKROU (V)	20.8.2021 PH jm Duch





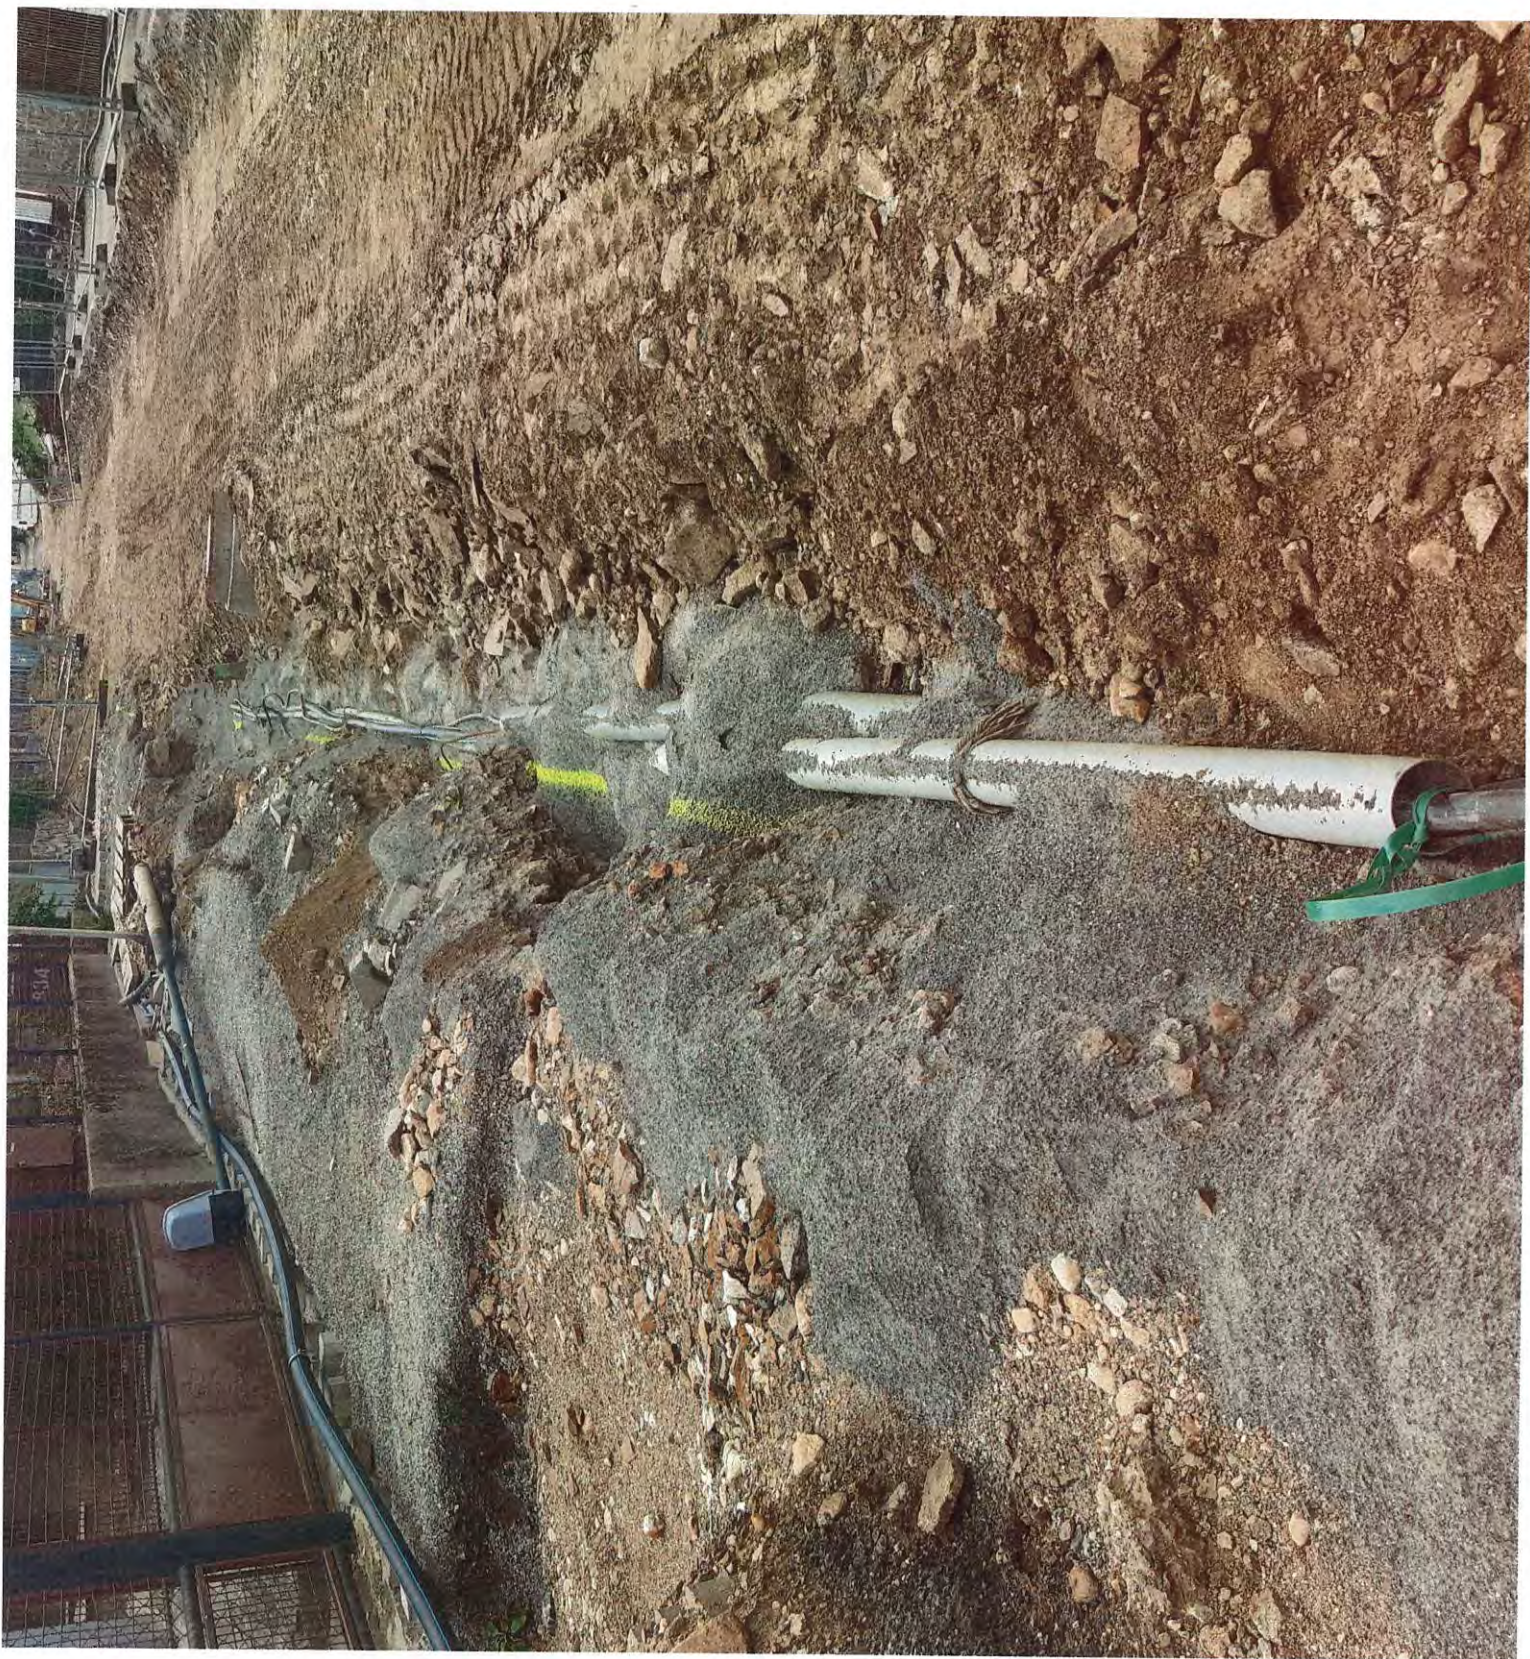












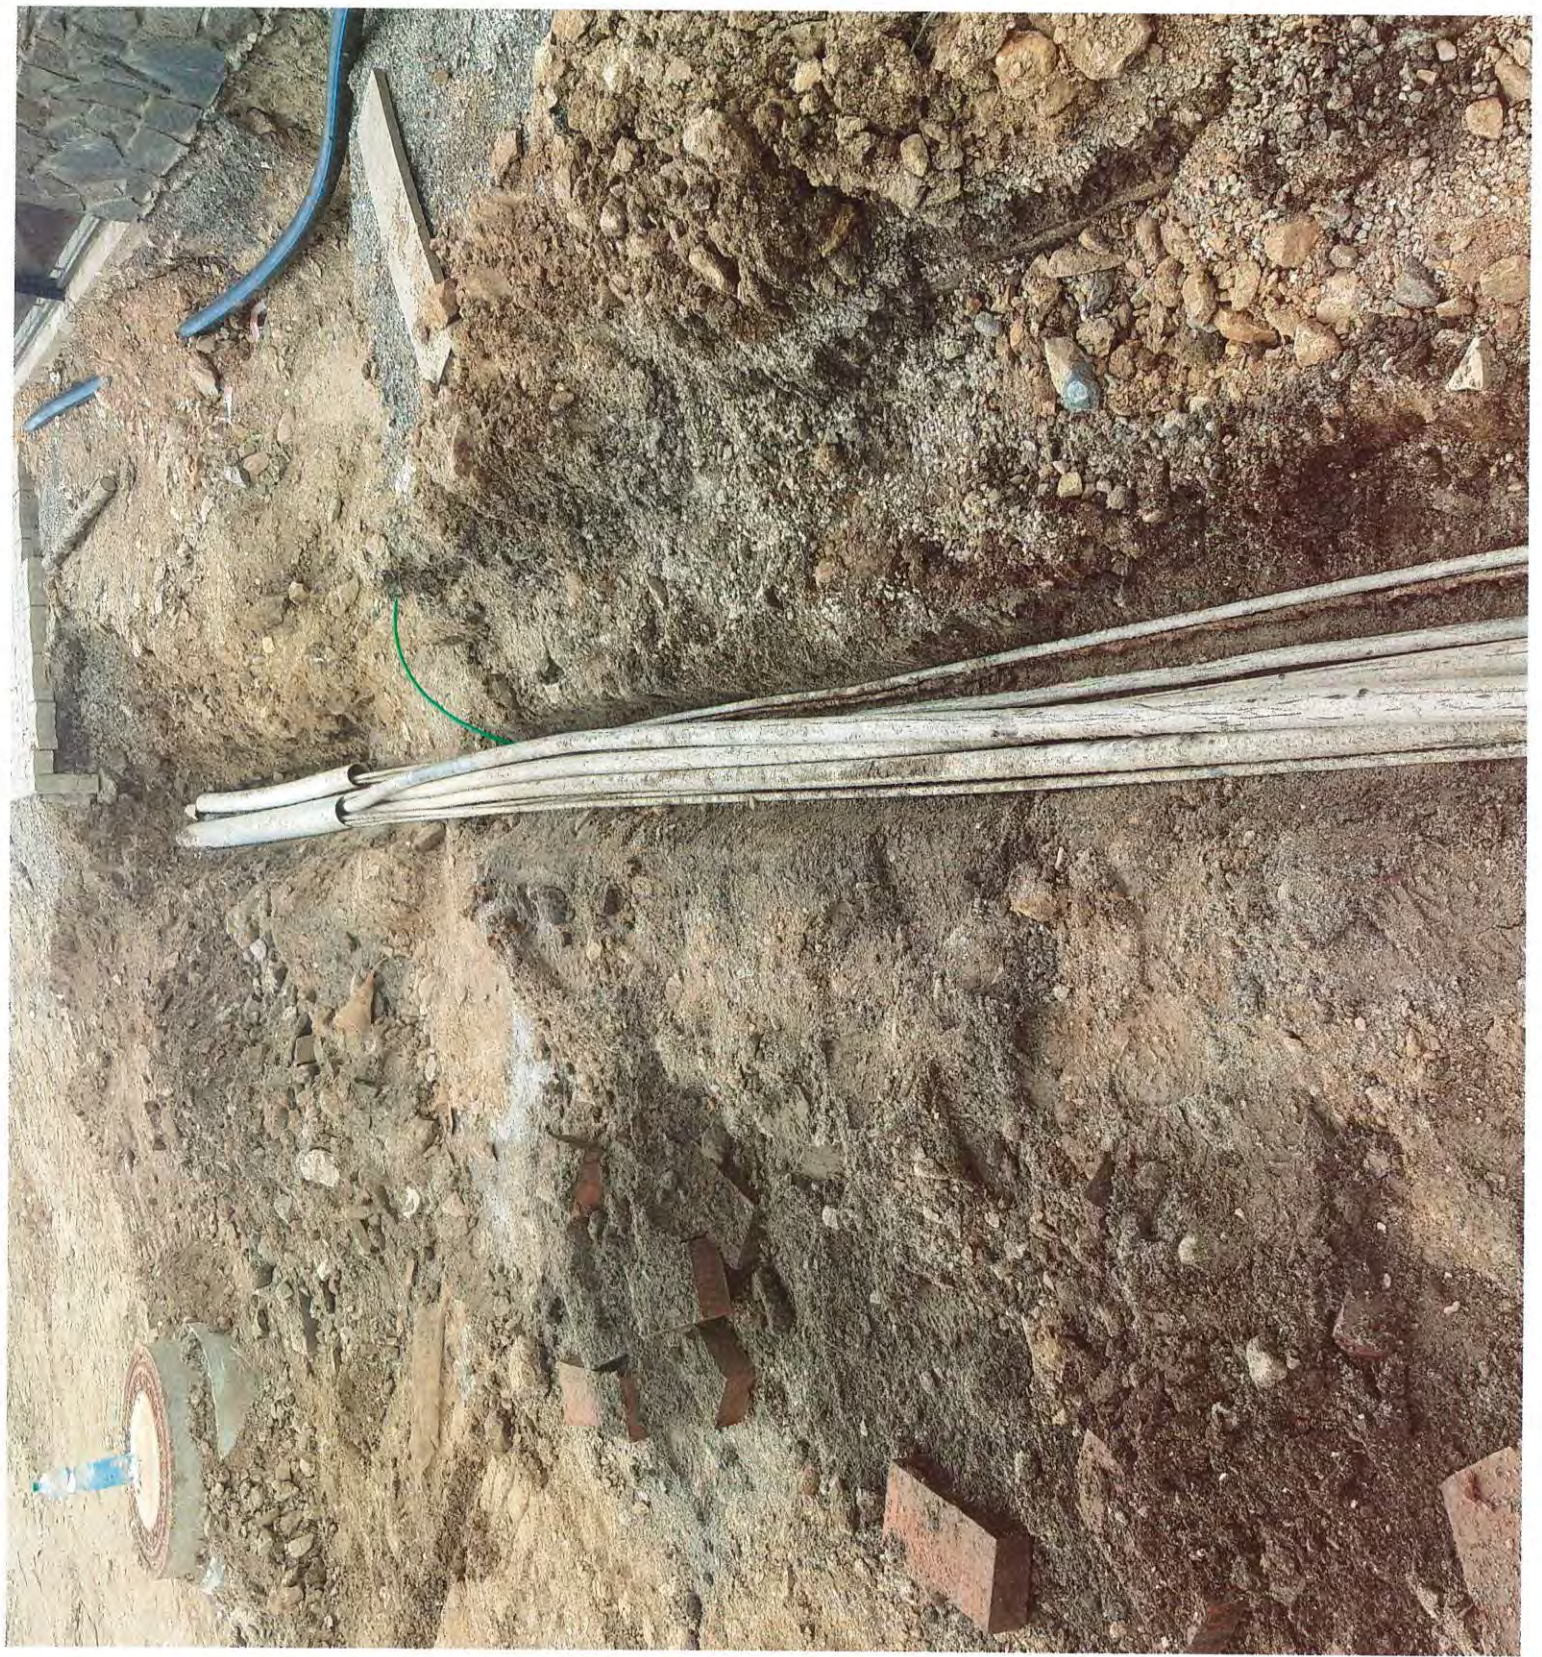

Datum:

30.7 2021

$p\Delta$

POČET PRIZNANIKŮ 6 + 1 THP

MECHANIZACE: PÁSOVÁ A KOLOVÁ B462, TATRA, NAKLADAC

POPIS PRÁCE: VYBODRÁNÍ STŘIVÁČEK PŘÍPOJKY ~~DE~~ SRAŽKOVÉ

KANALIZACIJE Č.P. 209, ZASLEPENI 2 km OTVORI VE STA-

VAJICI KANALIZACI DN 700, KAPOJEVI NOVE PRIPRUGE

SPRÁSKOVÉ KANALIZACE PŘES SEČLO DO VTVRTANÉHO NÁČHO

OTUORE. Vikar RTHY NOVE SPAS. KANANAUZACE E.P. 191

28. 2021

१०

POČET PRACOVNÍKŮ 5 + 1 TUP

MECHANIZACE: RÁSOVÍ BAGR 9L a 2L, TATRA, NAKLADAČ

POPIS PRÁCE: VYVRTÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ DO STĚN

KANALIZACE č.p. 191 A STAVAJÍCÍ ZACHYT Č.p. 210

NAPOJENÍ SPRAŠKOVÉ PŘÍPOJKY ČD. 191 a 210 0351P4

24.5.10 30.04 24.5.10 STAVAJICI ZEMURU FUTKOP 12.44

DEŠT. KAWALILACE Č.P. 191, MAPOVENÍ DEŠT. PRÍPOKY Č.P. 191

DO NOVE DEST. KANALIZACE (VP)

Novi Destr

РѢШЕНИЯ

т.р 191

28

(9)

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

3.8 2021

DNES 3.8.2021 BYLA V MÍSTĚ STAVBY V ÚSEKU

5

OD HRANICE POZEMKU Č.p. 833 (STANICEMI) 994,0 m DO KRAJA

PRVNÍ ETAPY STANOVENÍ 210 m) ZJIŠTĚNÁ KOLIZE S

INŽENÝRSKÝMI SÍTEMÍ (KABELŮ). TYTO JS BRÁNÍ PRA

SPECIFIKOVANÝM V PŘEDMĚTU SOD. PO PORUŠENÍ VĚCNÉHO A

ADMINISTRATIVNÍHO UPLÝŠENÍ VZNIKLÉ SITUACE

ZADOTOVITEL POZASTAVUJE VEŠKERÉ PRÁCE TOUTO KOL

DOTČENÉ. ZHOTOVITEL PREDIKUJE ZMĚNU BĚHEM VYSTAVY

A UPOZORŇUJE NA MOŽNÉ DOPADY S TÍM SPOJENÉ

ŽADAME OBJEDNATELE O SPOLUPRÁCI S ŘEŠENÍM TOTOHO

STAU NA STAU BE

DNE 38. 2021 ZAPSAL V ONTECH

CETIN ANETU

Kolize verneu!

(8)

Denní záznamy stavby:

List č.

0603227

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO 14-20°C

PRACOVNÍ DOBA: 6⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRACOVNÍKŮ: 1THP+5

MECHANIZACE: PÁSOVÝ BAGER 2L, 9L, NAKLADÁČ, TATRA

POPIS PRÁCE: ZÁSTUP A AUTNEMÍ VÝKOPU VOD. PŘÍPOJEK, KUDNÍ VÝKOP A OCTISTEMÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ CETIN A NEJTU (KOLIZE S OBZVOU)

13.8.2021

PA

Guh

POČASÍ: POLOJASNO 16-30°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 11⁰⁰

POČET PRACOVNÍKŮ: 5+1THP

MECHANIZACE: PÁSOVÝ BAGER 9L, NAKLADÁČ, TATRA

POPIS PRÁCE: STŘEŠNÍ VÝKOP NA PLÁŤ OD Č.P. 191 K Č.P. 833, HUTNEMÍ PLÁŤE I. ETAPY,

14.8.2021

SD

Guh

POČASÍ: OBLAČNO 15-24°C

PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰ - 17⁰⁰

POČET PRACOVNÍKŮ: 5+1THP

MECHANIZACE: PÁSOVÝ BAGER 2L, 9L, NAKLADÁČ, TATRA

POPIS PRÁCE: VÝKOP KUDNÍ PŘÍPOJEK VODOVODU DN 32 ČP 194, 195 a 839, KUDNÍ VÝKOP A OCTISTEMÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ CETIN A NEJTU

16.8.2021

PO

CETIN A NEJTU
KOLIZE VEDENÍpřes vod
16.8 - 30.8

Foto ?

⑧

ZÁPIS ZADAVATELE: ZJIŠTĚNA KOLIZE KABELU NN (PŘEVOD PŘES KOMUNIKACI) V MÍSTĚ U Č.P. 833. KABEL NN JE ULOŽEN BEZ DOSTATEČNÉHO KRYTÍ V KOMUNIKACI A JE PŘEBETONOVÁN V DÉLCE CCA 2m NAALÁŠENÝ SPRÁVCI KABELU FIRMA EON ⇒ PŘEDBEŽNĚ JE DOMLUVENO UPRÁVIT KABELU PRO VÝKOP A PŘELOŽENÍ (ZAHLOUBENÍ). PAN POLEJSÍ (EON) JE PŘIZVÁN NA KONTROLU DEN DNE 18.8.2021 OD 13 hod

Guh
Mudil

Guh





HARMONOGRAM PRACÍ - „Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku ulice Šafaříkova v Sezimově Ústí“

„Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu“

Investor: Město Sezimovo Ústí a Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

[illegible]

HARMONOGRAM PRACÍ - „Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku ulice Šafaříkova v Sezimově Ústí“

„Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu“

Investor: Město Sezimovo Ústí a Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

NÁZEV ČINNOSTI	prosinec																															
	49. týden								50.týden								51.týden								52.týden							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Předání staveniště 18.3.2021																																
zemní práce vodovodní přípojky - stávající od resturace Vila po pekárnu																																
splašková kanalizace přípojky komplet od restaurace Vila po pekárnu																																
oprava rozbyté kanalizační trubky																																
vodovodní přípojky pravá strana Profastav																																
realizace (přípomocné práce) pro stranovou přeložku datových kabelů																																
zemní práce pro veřejné osvětlení/přeložka kabelů Cetin+NejTv																																
zemní práce pro komunikaci a chodník																																
zemní práce pro parkoviště u reataurace VILA																																
práce na drenáži komunikace komplet																																
šterkové konstrukční vrstvy																																
pokládka obrubníků + UV komunikace/parkoviště																																
pokládka zámkové dlažby v chodníku																																
pokládka zámkové dlažby v parkovacím stání komunikakce/parkoviště																																
předláždění stávajícího chodníku																																
pokládka asfaltových vrstev I.Etapa																																
kompletace veřejného osvětlení, montáž stožárů atd.																																
terénní úpravy, dokončovací práce																																
